



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID 9106038728

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3 КЪМ ДОГОВОР № 13255 от 25.08.2014г.

Днес 20.12......2017г. в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение № 3 към Договор № 13255/25.08.2014 г. „Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове (ГРП) за Блокове от 1 до 8 на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД в резултат на проведена процедура на договаряне с обявление, рег.№ 13143 между:

1. „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: 6265, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, обл. Старозагорска, тел. 042/662214; факс: 042/662000; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN:BG 22 ТТВВ 9400 1526 6809 53, BIC: ТТВВВВ22, при „Сосиете женерал експресбанк“ гр. Раднево, представлявано от **инж. Живко Динчев – Изпълнителен директор**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2. ДЗЗД „МТ ИНЖЕНЕРИНГ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ №188; тел.: 02/9532790, факс: 02/9532790; регистрирано в търговски регистър при Агенция по вписванията; ЕИК по Булстат: 175864515;; Разплащателна сметка: IBAN: BG28 UBBS 8002 1021 2485 40 BIC: UBBSBGSF, представлявана от **Никола Николов – Управляващ**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

Съдружници в обединението: „Техно строй България“ ООД с ЕИК 175410402 и ЕТ „Мирса - 93 - Цветан Асенов“ с ЕИК 831374518

КАТО СЕ ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ:

Договор № 13255/ 25.08.2014г. с предмет „Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове (ГРП) за Блокове от 1 до 8 на ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД” е в изпълнение на проектите BG-\$-0009, BG-\$-0010, BG-\$-0020 като част от Националния план за инвестиции за периода 2013-2020 година във връзка с дерогация по чл. 10в от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европа, и е свързан с намаляване на вредни емисии на парникови газове.

Срокът на договора е 4 години, считано от 25.08.2014 г.

Срокът за изпълнение на Етап 3 от договора е до 150 календарни дни считано от 25.01.2016г. съгласно официално изпратено наше писмо № 2572/22.01.2016г.

На 21.04.2016г беше подписан акт № 10 за спиране на строителството на Етап 3 поради изграждане на система за монтаж и демонтаж на вертикални кубове на Част 700MW от страна на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, а на 12.12.2016г. се подписа акт № 11 за продължаване на строителството на Етап 3.

На 20.12.2016. беше подписан Протокол № II за завършен монтаж на Вътрешната газопроводна мрежа

На 22.12.2016г. беше подписан акт № 10 за спиране на строителството на Етап 3 поради лоши метеорологични условия, а на 05.03.2017г. се подписа акт № 11 за продължаване на строителството на Етап 3.

На 20.03.2017г. беше подписан Протокол №I за завършен монтаж на ГРП № 7, с който бяха завършени СМР по Етап 3, което от своя страна е предпоставка за въвеждането на Етап 3 в експлоатация.

Съгласно гореизложеното СМР на вътрешната газопроводна мрежа и ГРП 7 са изпълнени за 109 календарни дни.

На 12.05.2017г. поради липсващ сключен договор за доставка на природен газ беше подписано Допълнително споразумение №2 за удължаване срока за изпълнение на Етап 3 до 28.12.2017г.

Въвеждането в експлоатация на Етап 3 може да се осъществи след провеждане на успешно комплексно изпробване в продължение на 72 часа.

При откриването на процедурата и изготвянето на проектодоговора към нея, първоначално определеният срок на изпълнение е предвиден прогнозно поради липсата на официално съгласуван с „ЕСО” ЕАД график за планови ремонти на ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД за 2018г.

С писмо №35110/17.10.2017г, „ЕСО” ЕАД приложено представи съгласуван график за планови ремонти на ТЕЦ"Марица изток 2" ЕАД през 2018г, където е планирано спиране на Блок 7 за периода 13.07 – 16.08.2018г. Предвид плановото спиране за ремонт на Блок 7, Изпълнителят е в невъзможност да извършва настройки и 72-часови изпитания на Етап 3, поради което въвеждането в експлоатация на Етап 3 не може да бъде изпълнено до 28.12.2017г.

Гореописаните непредвидени обстоятелства налагат удължаване на срока за изпълнение на етап 3 до 23.08.2018г. Изменението на срока за изпълнение на Етап 3 не води до промяна на цялостния характер на поръчката, стойността и крайния срок за изпълнение на договора.

Ето защо, на основание чл.116, ал.1, т.6 от ЗОП

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


Точка 2.3 Етап 3 от Раздел III „Срок за изпълнение“ се изменя както следва:

„Доставка, монтаж, завършване на СМР и въвеждане в експлоатация на вътрешната газопроводна мрежа и ГРП № 7 – до 23.08.2018“.

Всички останали клаузи от договор № 13255 от 25.08.2014г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Иzp. директор
инж. Живко Динчев

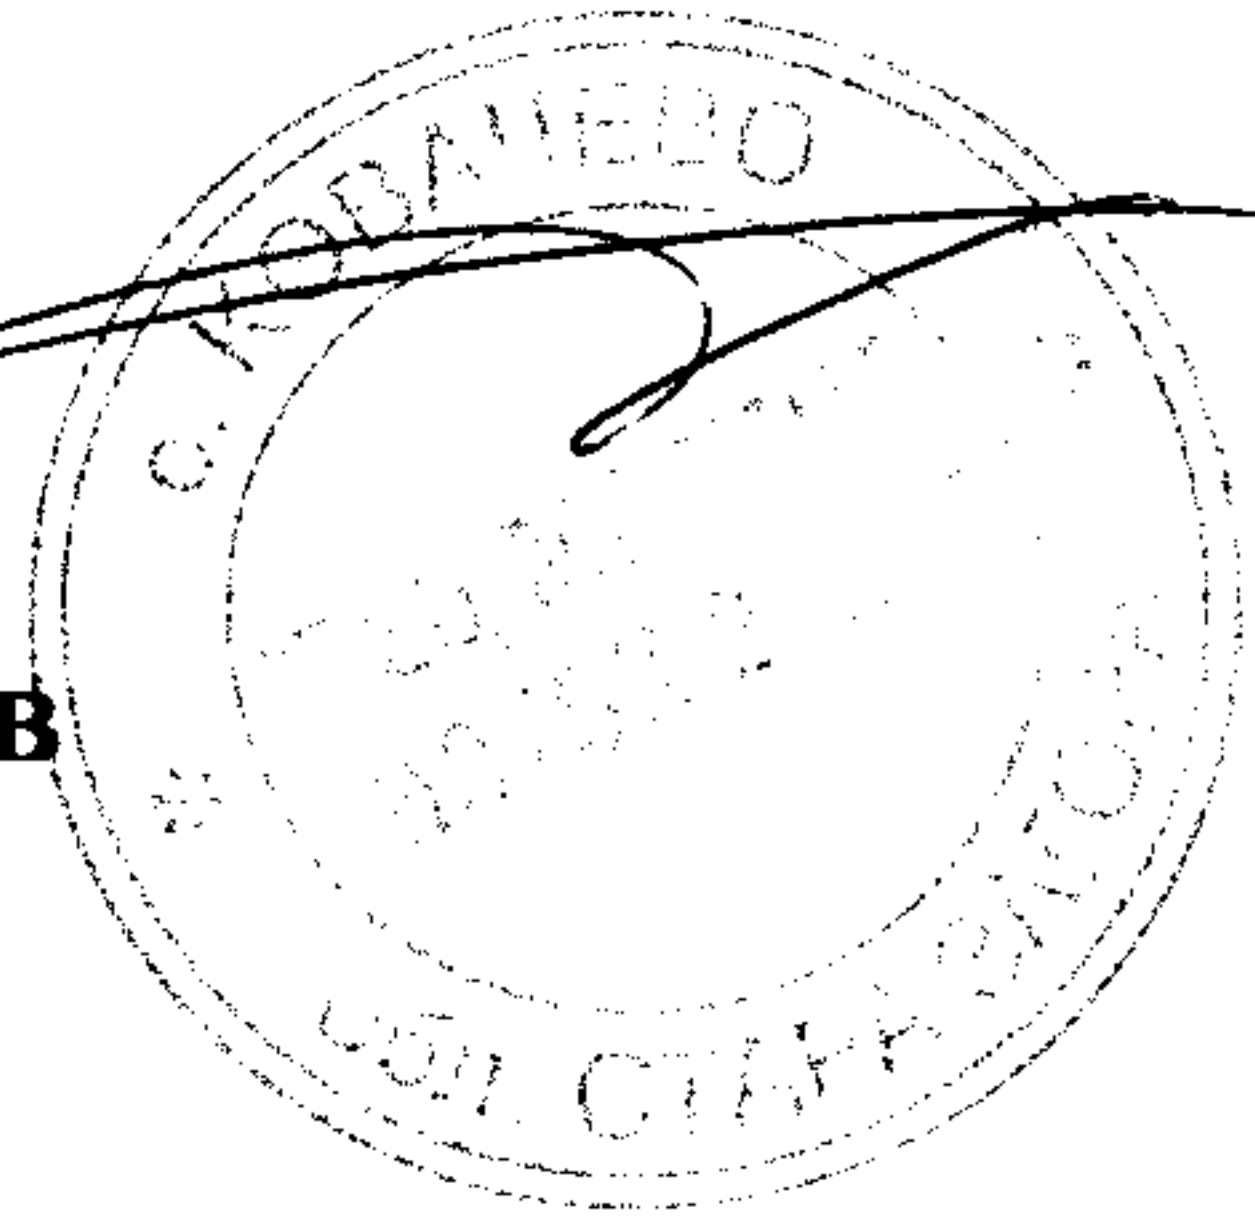

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
Никола Николов



Зам. изп. директор:
инж. М. Митков

Директор ДМОП:
Д. Неделчева

Директор ДЕ:
инж. Ил. Стоянов

Директор ДАДФК:
Р. Германов

Директор ДФИ:
Б. Боев

Гл. счетоводител:
С. Сотиров

Юрисконсулт:
П. Хаджийски

Ръководител ОИ:
Г. Василев

Отг. по договора:
Инж. Стоил Минев - Експерт МЧ
