

## **ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2** **към Договор № 15059/22.03.2017 г.**

Днес, ~~06.07~~ 2017г. в сградата на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 15059/22.03.2017 г. с предмет: „Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-10Ж” между страните:

**1. "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД** със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, IBAN: BG22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBBBG22, "Сосиете Женерал Експресбанк" АД, клон Раднево, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**2. „Техноинженеринг” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: 6000 Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” №89, ет.3, офис 3, тел. 042 966069, факс: 042 966656; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: 123759274, Ид. № по ДДС: BG123759274; IBAN: BG82 UNCR 7000 1522 1001 87; BIC: UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД гр. Стара Загора, представлявано от **Илиан Борисов Марков - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

### **Като взеха предвид следното:**

На 22.03.2017г. в резултат на проведена обществена поръчка с рег.№ 16106 и предмет „Среден ремонт на котлоагрегат (КА) – 10” между страните е сключен Договор № 15059 с предмет: „Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-10Ж”.


Поради наличие на обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, а именно:

Съгласно ремонтната програма за 2017г. действаща по време на провеждане на процедурата и сключване на договорите, Бл.№6 (ТГ-6 и КА-10) е в среден ремонт от 17.04. до 20.05.2017г. Срока за изпълнение на договорите е 34 дни от началото на ремонта.

Поради промяна на ремонтната програма на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2017г., съгласувана от „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, гр. София и получена на 31.03.2017г., срокът за извършване на среден ремонт на Бл.№6 е променен на 30 дни от 14.06. до 13.07.2017г. за което е сключено допълнително споразумение №1 от 10.04.2017г. към договора.

Поради непредвидена необходимост от производство на ток за обезпечаване на товарният график на страната се наложи по искане на ЦДУ (централно диспечерско управление) на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, гр. София да се промени датата на извеждане на Блок №6 за извършване на среден ремонт от 14.06. на 20.06.2017г.. За тази промяна и извеждане на блока в ремонт е подадена и разрешена от ЦДУ (централно диспечерско управление) на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, гр. София заявка №872 от 19.06.2017г.

Поради непредвиденото обстоятелство - промяна на датата на извеждане на блока в ремонт, настъпило след датата на сключване на договора и допълнително споразумение №1, което не можеше да бъде предвидено от Възложителя по време на стартиране на процедура с рег №16106 е налице **необходимост от изменение, което не променя цялостния характер на поръчката.**

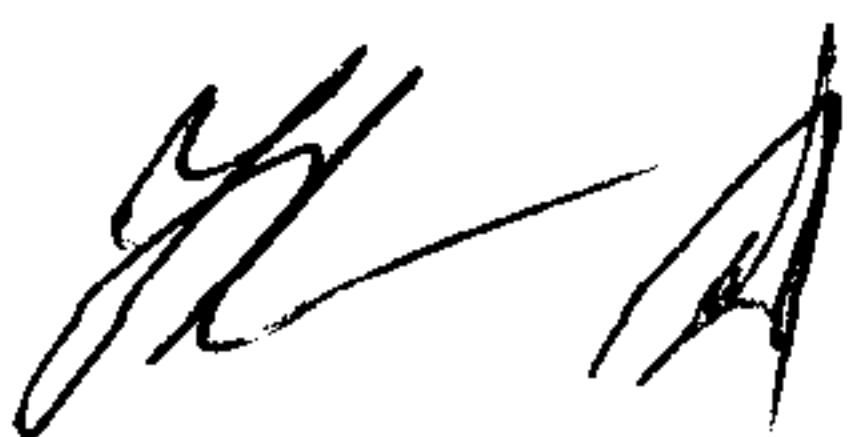

Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП

**СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:**

1. Точка 1 от Раздел III от договора се изменя, както следва:

„Срокът за изпълнение на договора е до 19.07.2017г.

2. Всички останали клаузи от Договор № 15059/22.03.2017 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Иzp. директор:


инж. Ж. Динчев



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Управител:

Ил. Стоянов

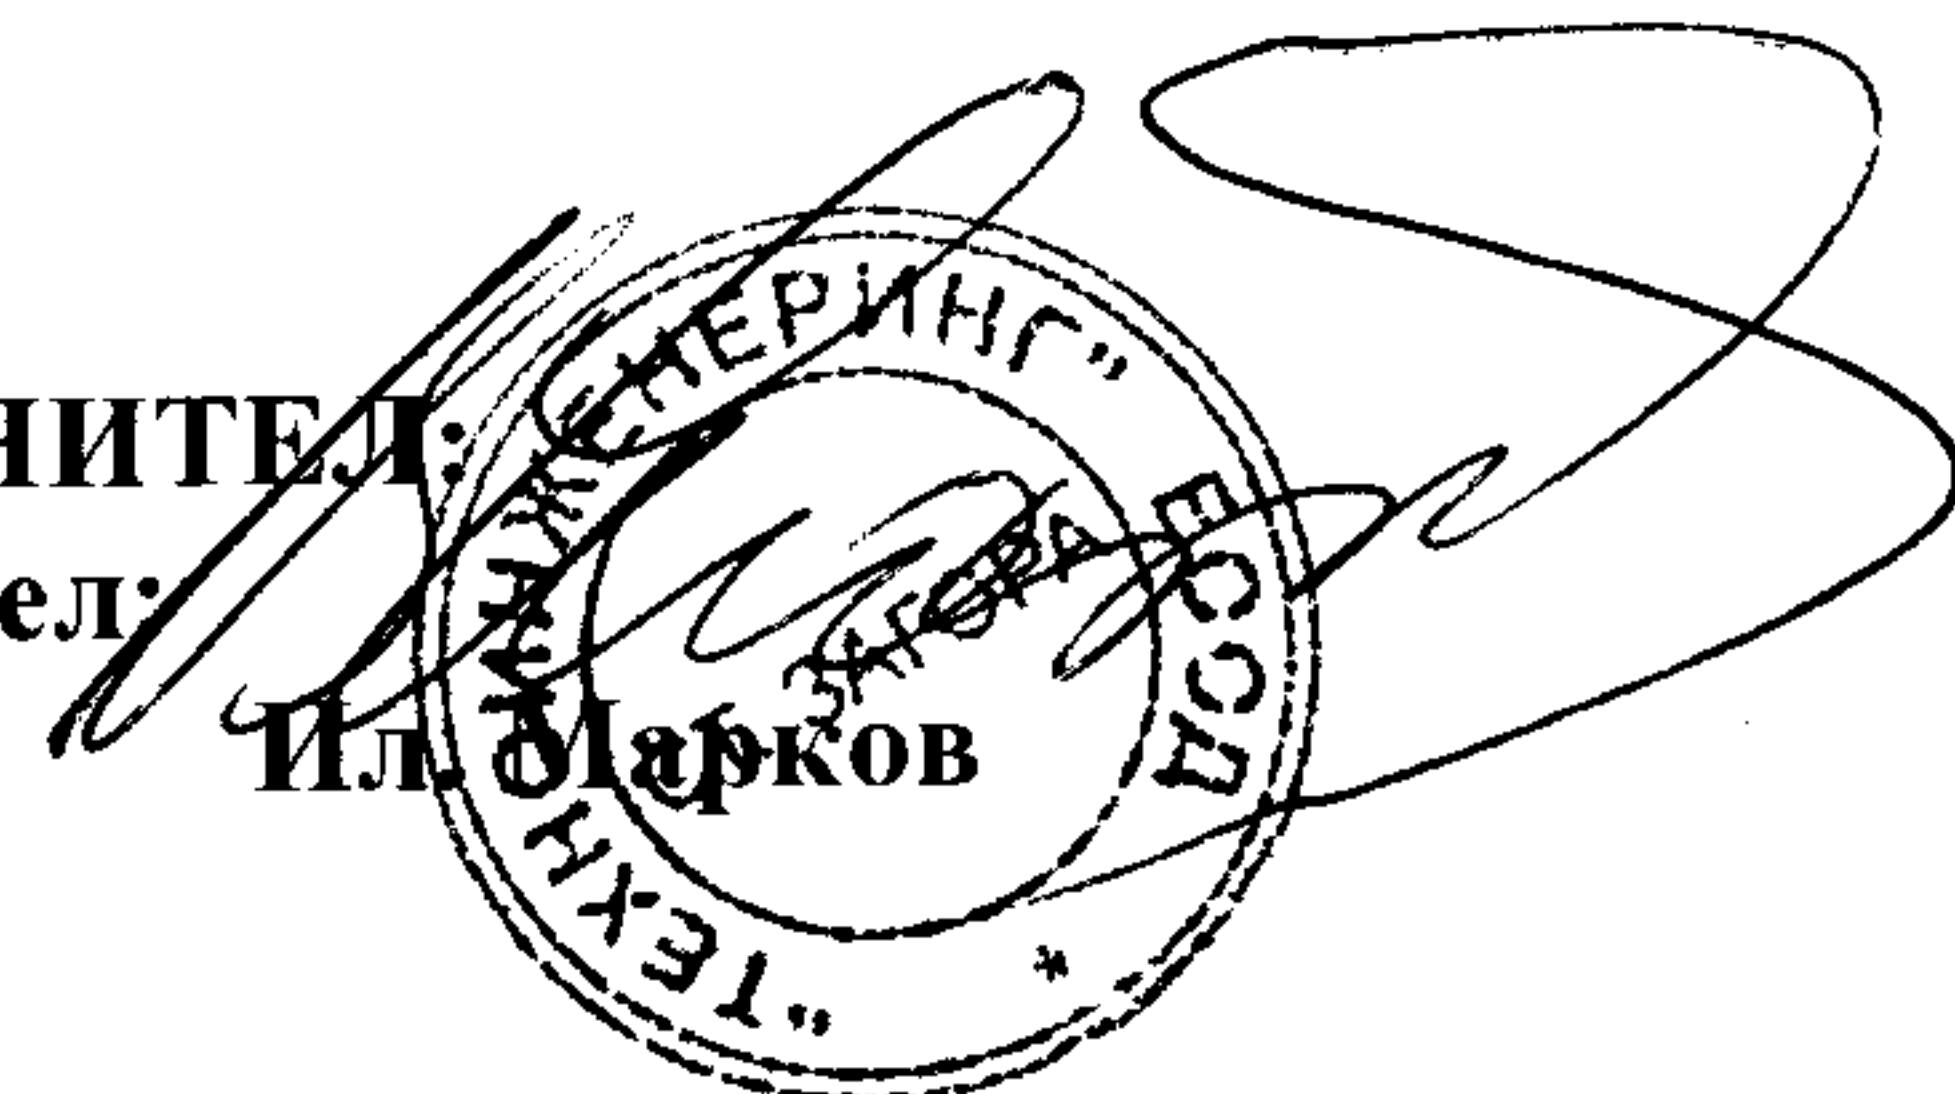

Зам. Изп. директор:

инж. М. Митков

Директор ДМОП:

Д. Неделчева

Директор ДАДФК:

Р. Германов

Директор Експлоатация:


инж. Ил. Стоянов

Директор ДФИ:

Б. Боев

Гл. Счетоводител:

С. Сотиров

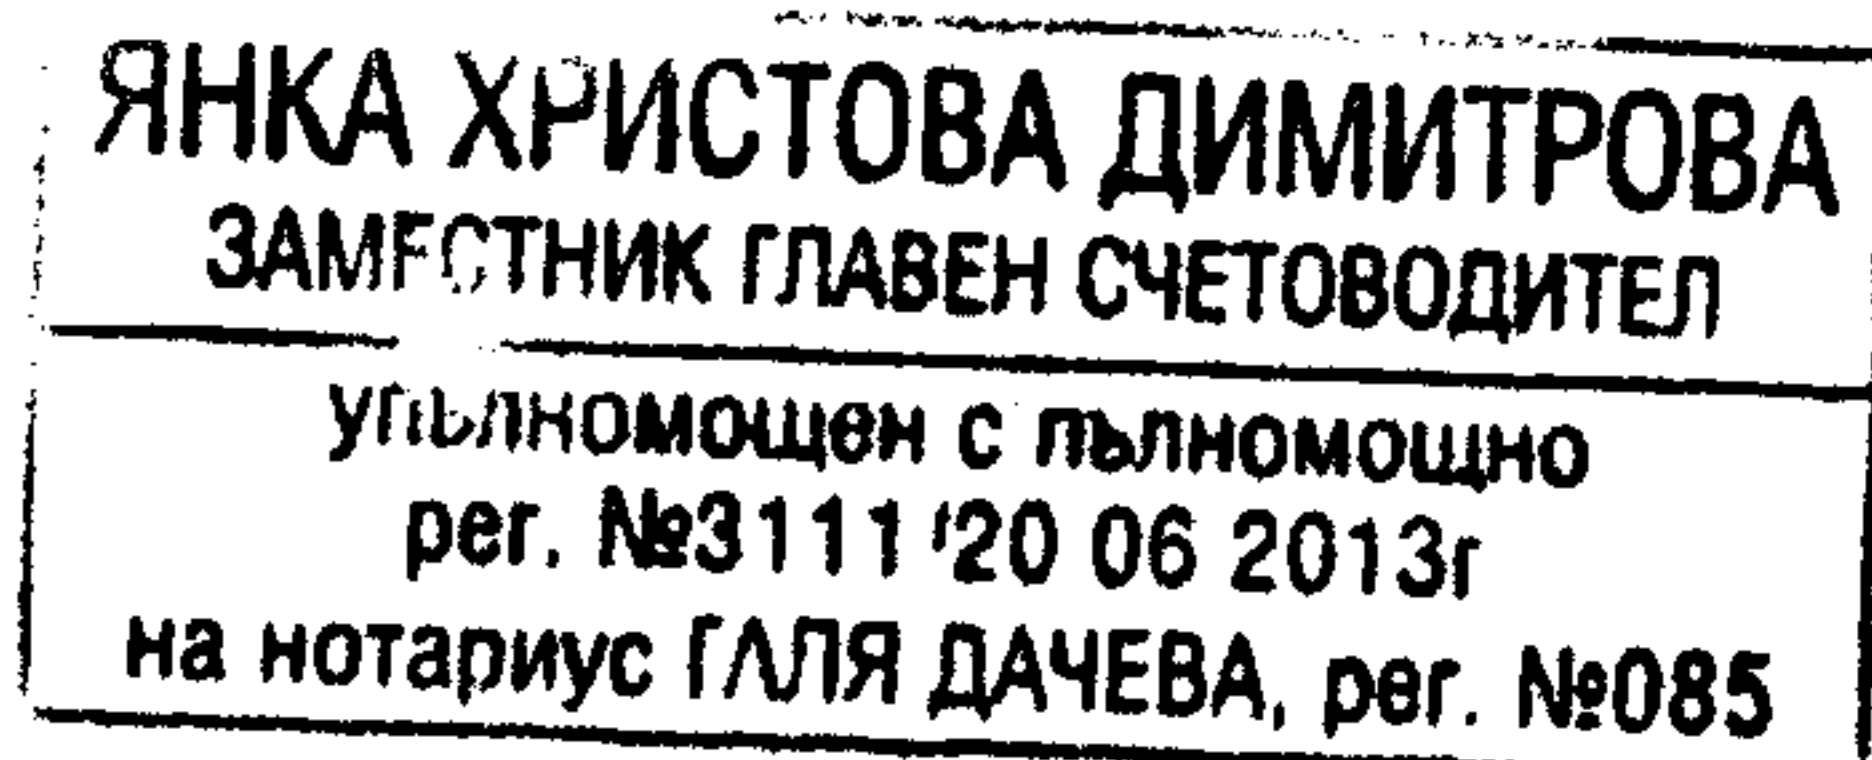

Юрисконсулт:

Ръководител ТО:

М. Макаков

Отг. по договора:

инж. Д. Радовски
