

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1**  
**към Договор № 15060/22.03.2017 г.**

Днес, ~~.....~~<sup>10.04</sup>2017г. в сградата на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 15060/22.03.2017 г. с предмет: „Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-10И” между страните:

**1. "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД** със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, IBAN: BG22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBBBG22, "Сосиете Женерал Експресбанк" АД, клон Раднево, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И

**2. „Техноинженеринг” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: 6000 Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” №89, ет.3, офис 3, тел. 042 966069, факс: 042 966656; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: 123759274, Ид. № по ДДС: BG123759274; IBAN: BG82 UNCR 7000 1522 1001 87; BIC: UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД гр. Стара Загора, представлявано от **Илиан Борисов Марков - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**Като взеха предвид следното:**

На 22.03.2017г. в резултат на проведена обществена поръчка с рег.№ 16106 и предмет „Среден ремонт на котлоагрегат (КА) – 10” между страните е сключен Договор № 15060 с предмет: „Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-10И”.

Първоначално определеният срок за изпълнение на договора е 34 дни след извеждане на котела в ремонт в периода 17.04.2017г. – 20.05.2017г.

Поради наличие на обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, а именно:


Съгласно ремонтната програма за 2017г. действаща по време на провеждане на процедурата и сключване на договорите, Бл.№ 6 (ТГ-6 и КА-10) е в среден ремонт от 17.04. 2017г. до 20.05.2017г. Поради промяна на ремонтната програма на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2017г., съгласувана от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и получена на 31.03.2017г., срока за извършване на среден ремонт на Бл.№ 6 е променен на 30 дни в периода от 14.06.2017г. до 13.07.2017г.

Тъй като изложените по-горе обстоятелства /промяната на ремонтната програма/ не можеха да бъдат предвидени от Възложителя по време на стартиране на процедура с рег №16106 е налице необходимост от изменение, което не променя цялостния характер на поръчката.

**Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП**

**СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:**

1. Точка 1 от Раздел III от договора се изменя, както следва:

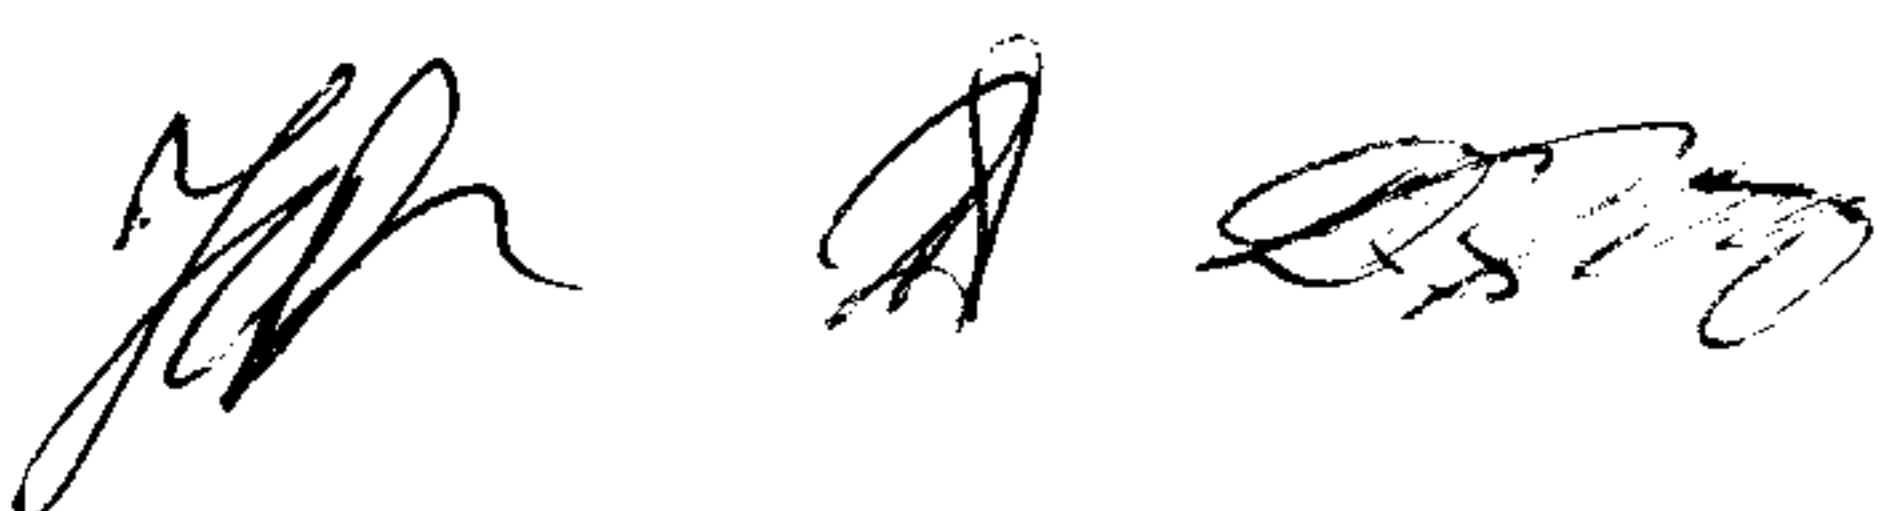

„Срокът за изпълнение на договора е 30 дни след извеждане на котела в ремонт. Съгласно ремонтен график на ремонтната програма на „ТЕЦ Марица изток 2“ЕАД за 2017г. Бл.№ 6 е в среден ремонт в периода от 14.06.2017г. до 13.07.2017г.

2. Всички останали клаузи от Договор № 15060/22.03.2017 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**Изп. директор:**

**инж. Ж. Динчев**



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**Управител:**

**Ил. Марков**

**Зам. Изп. директор:**

**инж. М. Митков**

**Директор ДМОП:**

**Д. Неделчева**

**Директор ДАДФК:**

**Р. Германов**

**Директор Експлоатация:**

**инж. Ил. Стоянов**

**Директор ДФИ:**

**Б. Боев**

**Гл. Счетоводител:**

**С. Сотиров**

**Юрисконсулт:**

**Ръководител ТО:**

**М. Мажаков**

**Отг. по договора:**

**инж. Д. Радовски**
