

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1**  
**към Договор № 15073/23.03.2017 г.**

Днес, ~~10.04~~ 2017г. в сградата на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 15073/23.03.2017 г. с предмет: „Среден ремонт на арматура, тръбопроводи и барабани на КА-10” между страните:

**1. "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД** със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, IBAN: BG22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBBBG22, “Сосиете Женерал Експресбанк” АД, клон Раднево, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**2. „Рудин” ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис” №136А, тел. 042/644664, факс: 042/641014; Електронна поща: office@rudin-bg.com; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: 202714798, Идн. № по ДДС: BG202714798; IBAN: BG98 FINV 9150 10UB 0188 89; BIC: FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД, гр. Стара Загора, представлявано от **Динко Драгиев Динев - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**Като взеха предвид следното:**

На 23.03.2017г. в резултат на проведена обществена поръчка с рег.№ 16106 и предмет „Среден ремонт на котлоагрегат (КА) – 10” между страните е сключен Договор № 15073 с предмет: „Среден ремонт на арматура, тръбопроводи и барабани на КА-10”.

Първоначално определеният срок за изпълнение на договора е 34 дни след извеждане на котела в ремонт в периода 17.04.2017г. – 20.05.2017г.


Поради наличие на обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, а именно:

Съгласно ремонтната програма за 2017г. действаща по време на провеждане на процедурата и сключване на договорите, Бл.№ 6 (ТГ-6 и КА-10) е в среден ремонт от 17.04. 2017г. до 20.05.2017г. Поради промяна на ремонтната програма на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2017г., съгласувана от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и получена на 31.03.2017г., срока за извършване на среден ремонт на Бл.№ 6 е променен на 30 дни в периода от 14.06.2017г. до 13.07.2017г.

Тъй като изложените по-горе обстоятелства /промяната на ремонтната програма/ не можеха да бъдат предвидени от Възложителя по време на стартиране на процедура с рег №16106 е налице **необходимост от изменение, което не променя цялостния характер на поръчката.**

**Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП**

**СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:**

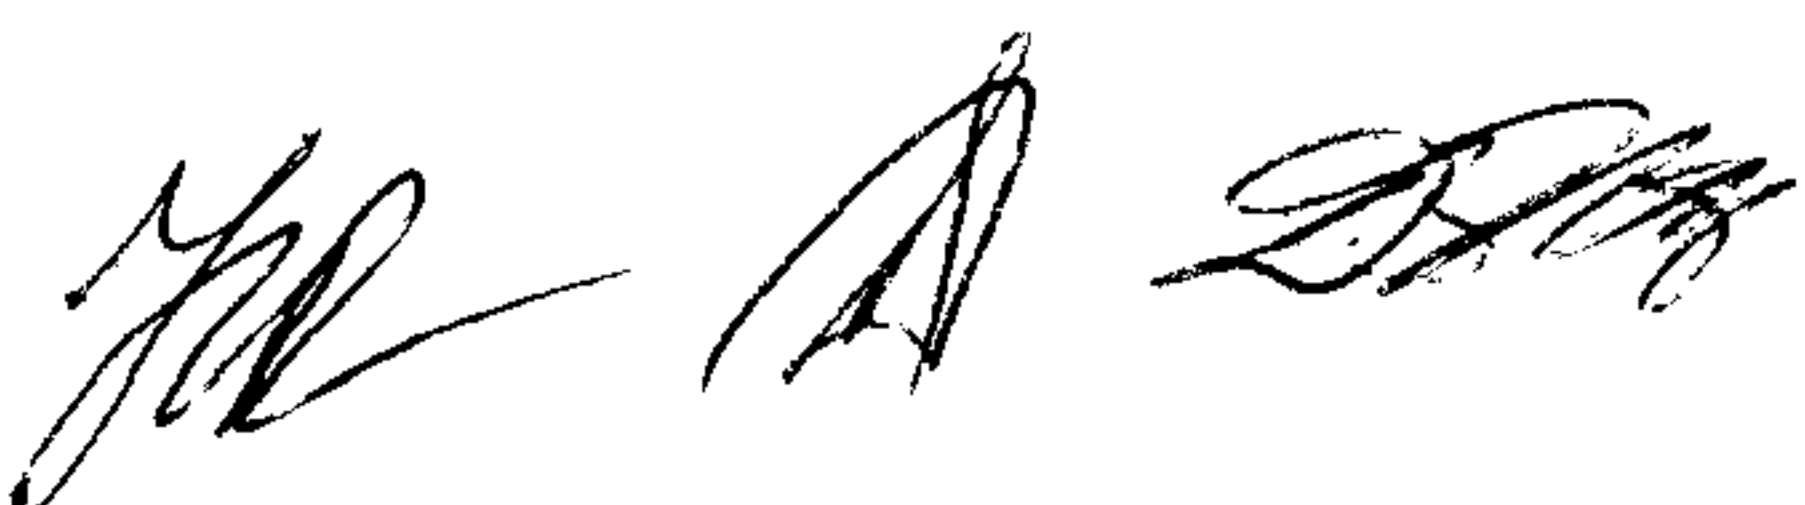

1. Точка 1 от Раздел III от договора се изменя, както следва:

„Срокът за изпълнение на договора е 30 дни след извеждане на котела в ремонт. Съгласно ремонтен график на ремонтната програма на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за 2017г. Бл.№ 6 е в среден ремонт в периода от 14.06.2017г. до 13.07.2017г.

2. Всички останали клаузи от Договор № 15073/23.03.2017 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**Изп. директор:**

инж. Ж. Динчев

**Зам. Изп. директор:**

инж. М. Митков

**Директор ДМОП:**

Д. Неделчева

**Директор ДАДФК:**

Р. Германов

**Директор Експлоатация:**

инж. Ил. Стоянов

**Директор ДФИ:**

Б. Боев

**Гл. Счетоводител:**

С. Сотиров

**Юрисконсулт:**

.....

**Ръководител ТО:**

М. Макаков

**Отг. по договора:**

инж. Д. Радовски

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**Управител:**

Д. Динев

