

## **ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2** **към Договор № 15076/23.03.2017 г.**

Днес, ~~06.07~~ 2017г. в сградата на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 15076/23.03.2017 г. с предмет: „Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС – 10В” между страните:

**1. "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД** със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, IBAN: BG22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBBBG22, "Сосиете Женерал Експресбанк" АД, клон Раднево, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**2. „Металинвест Ремко” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. Митрополит Методи Кусев” №48, ап.2, тел. 042/622491, факс: 042/622491; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: 106567752, Ид № по ДДС: .BG106567752; IBAN: BG07 UNCR 7000 1501 0148 04; BIC: UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД гр. Стара Загора, представлявано от **Иван Стойчев Русенов - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

### **Като взеха предвид следното:**

На 23.03.2017г. в резултат на проведена обществена поръчка с рег.№ 16106 и предмет „Среден ремонт на котлоагрегат (КА) – 10” между страните е сключен Договор № 15076 с предмет: „Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС – 10В”.

Поради наличие на обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, а именно:

Съгласно ремонтната програма за 2017г. действаща по време на провеждане на процедурата и сключване на договорите, Бл.№6 (ТГ-6 и КА-10) е в среден ремонт от 17.04. до 20.05.2017г. Срока за изпълнение на договорите е 34 дни от началото на ремонта.

Поради промяна на ремонтната програма на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2017г., съгласувана от „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, гр. София и получена на 31.03.2017г., срокът за извършване на среден ремонт на Бл.№6 е променен на 30 дни от 14.06. до 13.07.2017г. за което е сключено допълнително споразумение №1 от 10.04.2017г. към договора.

Поради непредвидена необходимост от производство на ток за обезпечаване на товарният график на страната се наложи по искане на ЦДУ (централно диспечерско управление) на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, гр. София да се промени датата на извеждане на Блок №6 за извършване на среден ремонт от 14.06. на 20.06.2017г.. За тази промяна и извеждане на блока в ремонт е подадена и разрешена от ЦДУ (централно диспечерско управление) на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, гр. София заявка №872 от 19.06.2017г.

Поради непредвиденото обстоятелство - промяна на датата на извеждане на блока в ремонт, настъпило след датата на сключване на договора и допълнително споразумение №1, което не можеше да бъде предвидено от Възложителя по време на стартиране на процедура с рег №16106 е налице **необходимост от изменение, което не променя цялостния характер на поръчката.**



**Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП**

**СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:**

1. Точка 1 от Раздел III от договора се изменя, както следва:

„Срокът за изпълнение на договора е до 19.07.2017г.


2. Всички останали клаузи от Договор № 15076/23.03.2017 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**Изп. директор:**


инж. Ж. Динчев

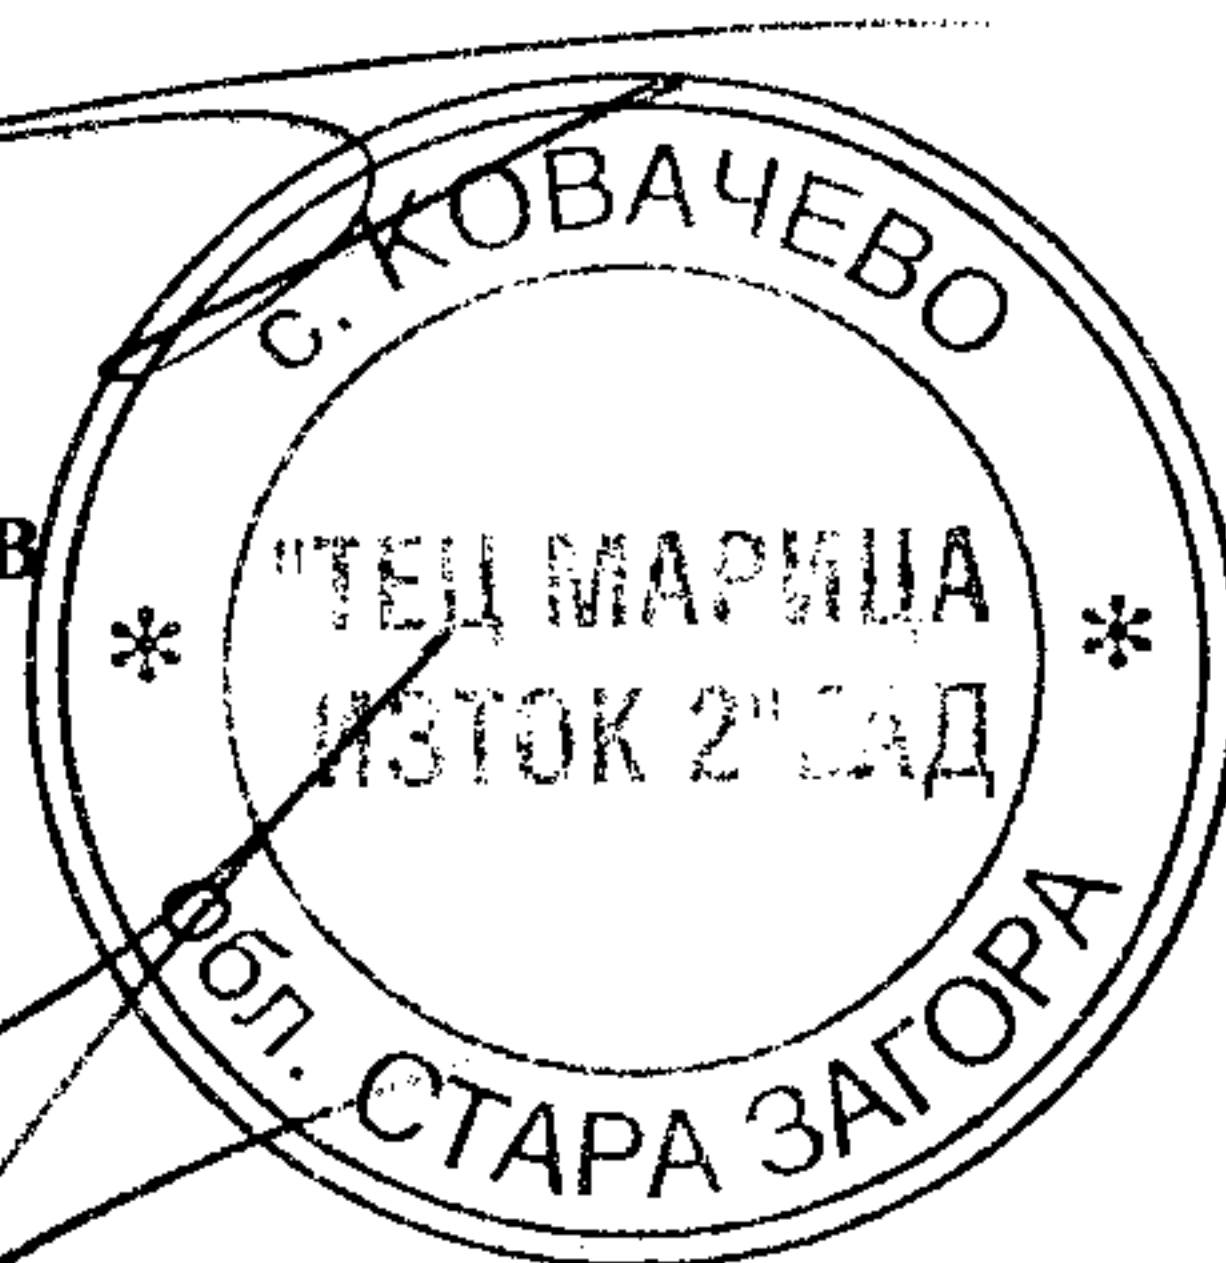

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**Управител:**

Ив. Русенов

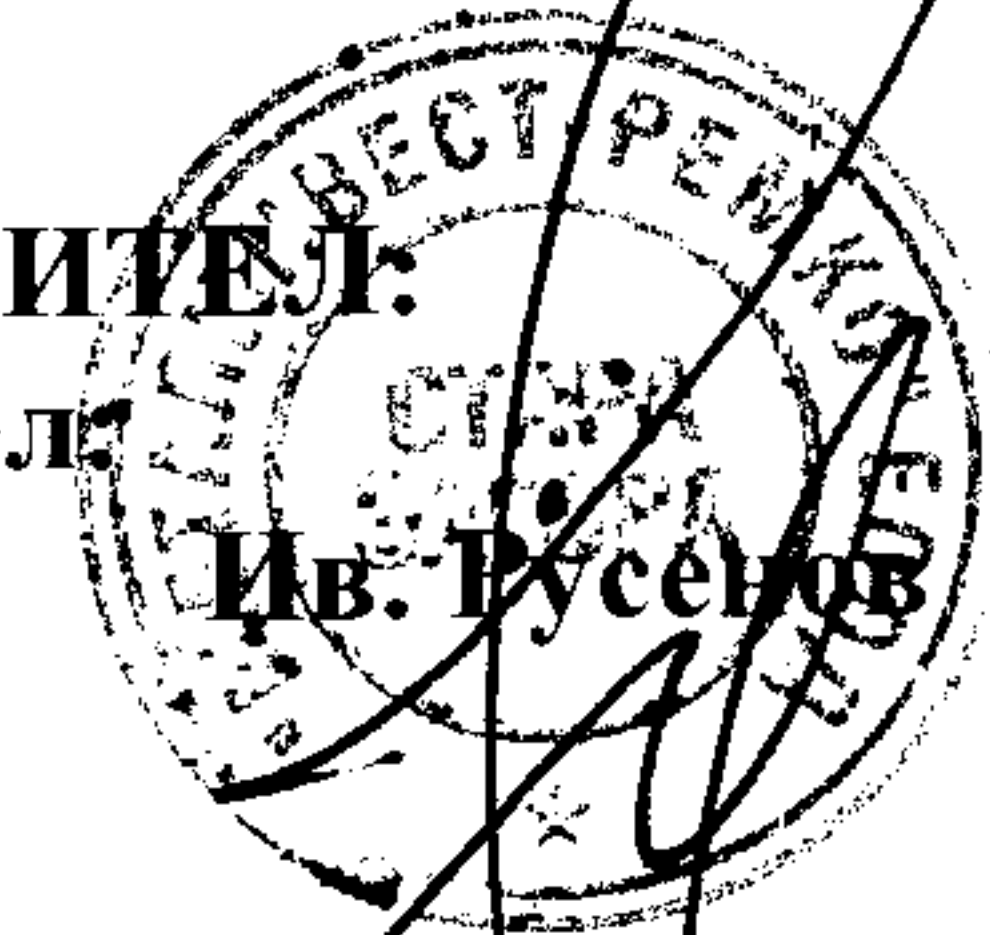

**Зам. Изп. директор:**

инж. М. Митков

**Директор ДМОП:**

Д. Неделчева

**Директор ДАДФК:**

Р. Германов

**Директор Експлоатация:**

инж. Ил. Стоянов

**Директор ДФИ:**

Б. Боев

**Гл. Счетоводител:**

С. Сотиров

**ЯНКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА**  
**ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ**

упълномощен с пълномощно  
рег. №3111/20.06.2013г  
на нотариус ГЛЯ ДАЧЕВА, рег. №085

**Юрисконсулт:**

.....

**Ръководител ТО:**

М. Макаков

**Отг. по договора:**

инж. Д. Радовски
