

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор № 15095/29.03.2017 г.

Днес, ~~10.04~~ 10.04.2017г. в сградата на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 15095/29.03.2017 г. с предмет: „Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-10А" между страните:

1. "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 129531939, IBAN: BG22 ТТВВ 9400 1526 6809 53, BIC: ТТВВВВ22, "Сосиете Женерал Експресбанк" АД, клон Раднево, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И

2. „Металик” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. Индустриален, тел. 042/612811, факс: 042/612814; Електронна поща: headoffice@idagroup-bg.com; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: 833067427, Ид № по ДДС: BG833067427; Разплащателна сметка: IBAN: BG34STSA93000012465821; BIC: STSABGSF, „Банка ДСК” ЕАД клон гр. Стара Загора, представлявано от **инж. Дечко Иванов Колев - Председател на СД**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Като взеха предвид следното:

На 29.03.2017г. в резултат на проведена обществена поръчка с рег.№ 16106 и предмет „Среден ремонт на котлоагрегат (КА) – 10” между страните е сключен Договор № 15095 с предмет: „Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-10А”.

Първоначално определеният срок за изпълнение на договора е 34 дни след извеждане на котела в ремонт в периода 17.04.2017г. – 20.05.2017г.


Поради наличие на обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, а именно:

Съгласно ремонтната програма за 2017г. действаща по време на провеждане на процедурата и сключване на договорите, Бл.№ 6 (ТГ-6 и КА-10) е в среден ремонт от 17.04. 2017г. до 20.05.2017г. Поради промяна на ремонтната програма на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2017г., съгласувана от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и получена на 31.03.2017г., срока за извършване на среден ремонт на Бл.№ 6 е променен на 30 дни в периода от 14.06.2017г. до 13.07.2017г.

Тъй като изложените по-горе обстоятелства /промяната на ремонтната програма/ не можеха да бъдат предвидени от Възложителя по време на стартиране на процедура с рег №16106 е налице необходимост от изменение, което не променя цялостния характер на поръчката.

Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

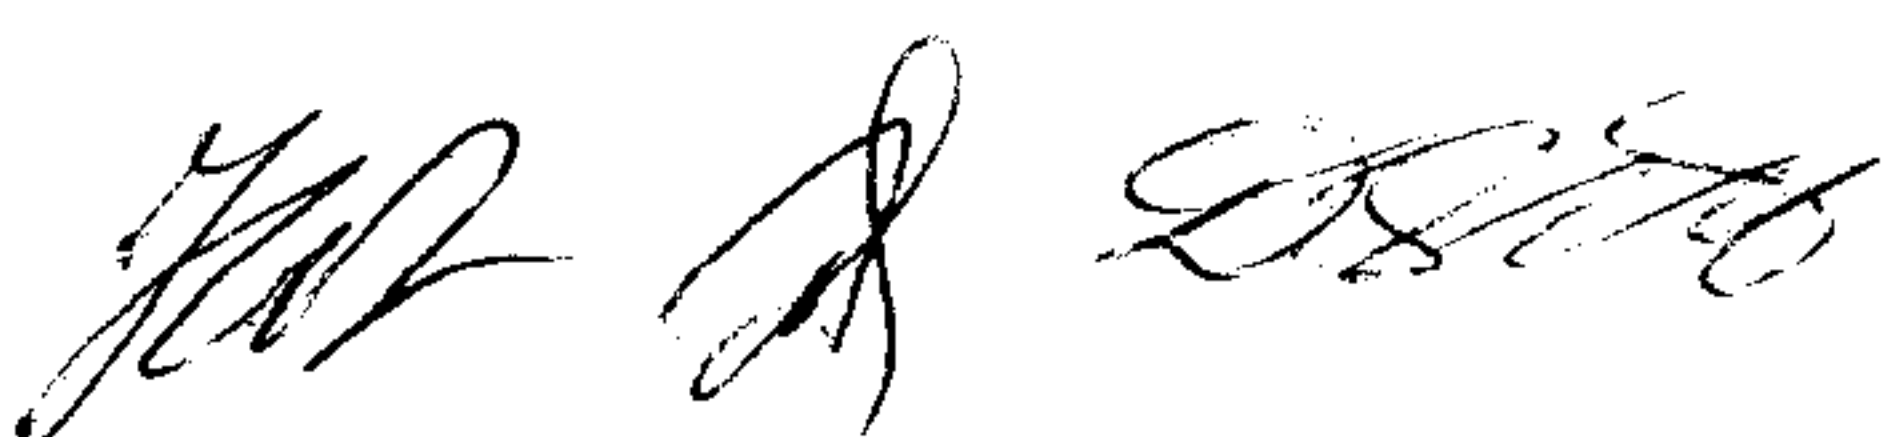

1. Точка 1 от Раздел III от договора се изменя, както следва:

„Срокът за изпълнение на договора е 30 дни след извеждане на котела в ремонт. Съгласно ремонтен график на ремонтната програма на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2017г. Бл.№ 6 е в среден ремонт в периода от 14.06.2017г. до 13.07.2017г.

2. Всички останали клаузи от Договор № 15095/29.03.2017 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор:

инж. Ж. Динчев

Зам. Изп. директор:

инж. М. Митков

Директор ДМОП:

Д. Неделчева

Директор ДАДФК:

Р. Германов

Директор Експлоатация:

инж. Ил. Стоянов

Директор ДФИ:

Б. Боев

Гл. Счетоводител:

С. Сотиров

Юрисконсулт:

А. Кейчева

Ръководител ТО:

М. Макаков

Отг. по договора:

инж. Д. Радовски

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Председател на СД:

инж. Д. Колев

