

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
КЪМ ДОГОВОР №15421/03.11.2017г

Днес 29.11.2017г в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение №1 към договор №15421/03.11.2017г с предмет: „Среден ремонт на мелещи вентилатори (МВ), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на прахопригответваща система ППС-12А”, сключен в резултат на проведена процедура на договаряне с обявление, рег.№ 17089, по I^{ва} обособена позиция..

между:

„ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBV94001526680953, BIC: TTBBBG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„Петко Петков – 24“ ЕООД, , със седалище и адрес на управление: гр Раднево, ул. Тачо Даскалов №5, ет.1, тел.: 0417/82242, факс: 0417/83098, Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: 123587426; IBAN: BG50UNCR76301075625550; BIC: UNCRBGSF Банка: Уникредит Булбанк – гр. Раднево, представлявано от Петко Антонов Петков - Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

за следното:

Съгласно ремонтната програма за 2017 г. Бл.№4 е в основен ремонт от 23.08. до 05.11.2017г., а Бл.№8 (ТГ-8, КА-12) е в среден ремонт от 08.11. до 03.12.2017г.


При извършване на основния ремонт на ТГ-4, възникна неотложна необходимост от отстраняване на наслоявания по ротора чрез пясъкоструене на лопатъчния апарат на диафрагмите и цялостно пясъкоструене, както и последващо динамично балансиране с цел отстраняване на предпоставките за поява на високи вибрации по време на експлоатация на турбината след ремонт. Горното бе установено и препоръчано от „Тошиба Интернешънъл (Юръп)” Лтд. в писмо реф. №0036/10.10.2017 г. (наш вх. № 34103 / 10.10.2017г.) при изпълнение на задълженията им по договор №12414 / 30.08.2013г. с предмет “Извършване на технически консултантски услуги по време на извършваните от Възложителя основни, средни и аварийни ремонти на турбинно, електрическо и КИП оборудване”.

В тази връзка, на проведен технически съвет (протокол ТС№72/10.10.2017г.) се разгледаха и приеха за изпълнение препоръките на „Тошиба Интернешънъл (Юръп)” Лтд, като бе проведена процедура за ремонт на турбината. Необходимостта от ремонт на турбината увеличи времето за извършване на предвидените дейности за ремонт на блок № 4.

Срокът за ремонт на блока е променен до 16⁰⁰ часа на 17.11.2017г. с наша заявка №5457/02.11.2017г. одобрена от „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, гр. София и заповед №1644/02.11.2017г. Бяха изменени всички действащи договори.

Промяната на срока на основния ремонт на Бл.№4 води до промяна на срока за извършване на среден ремонт на Бл.№8, който е следващ по ремонтната програма, тъй като двата ремонта не могат да се извършат едновременно. Новият срок за извършване на среден ремонт на Бл.№8 е от 20.11. до 17.12.2017г.

В съответствие с гореописаните непредвидени обстоятелства, изменящи срока за извършване на средния ремонт на Бл.№8, се налага на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП да се промени срокът за изпълнение на договора.

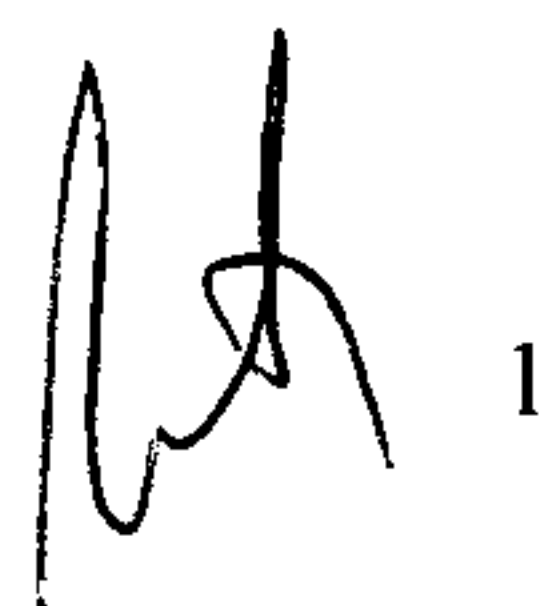 1

Поради гореизложеното и на основание чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Раздел III "Срок за изпълнение", чл. 1 от договора се изменя, както следва:
„Срокът за изпълнение на договора се удължава до 17.12.2017г.“
Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. Директор:

инж. Ж. Динчев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:

П.Петков

Зам. изп. директор:

инж. М. Митков

Директор „ДЕ“:

инж. Ил. Стоянов

Директор „ДМОП“:

Д.Неделчева

Директор „АДФК“:

Р. Германов

Директор „ДФИ“:

В. Боев

Гл. счетоводител

С. Сотиров


Юрисконсулт:

Ръководител „ТО“

М. Мажаков

Отг. по договора:

инж. Д. Радовски – н-к КЦ, тел. 662 240

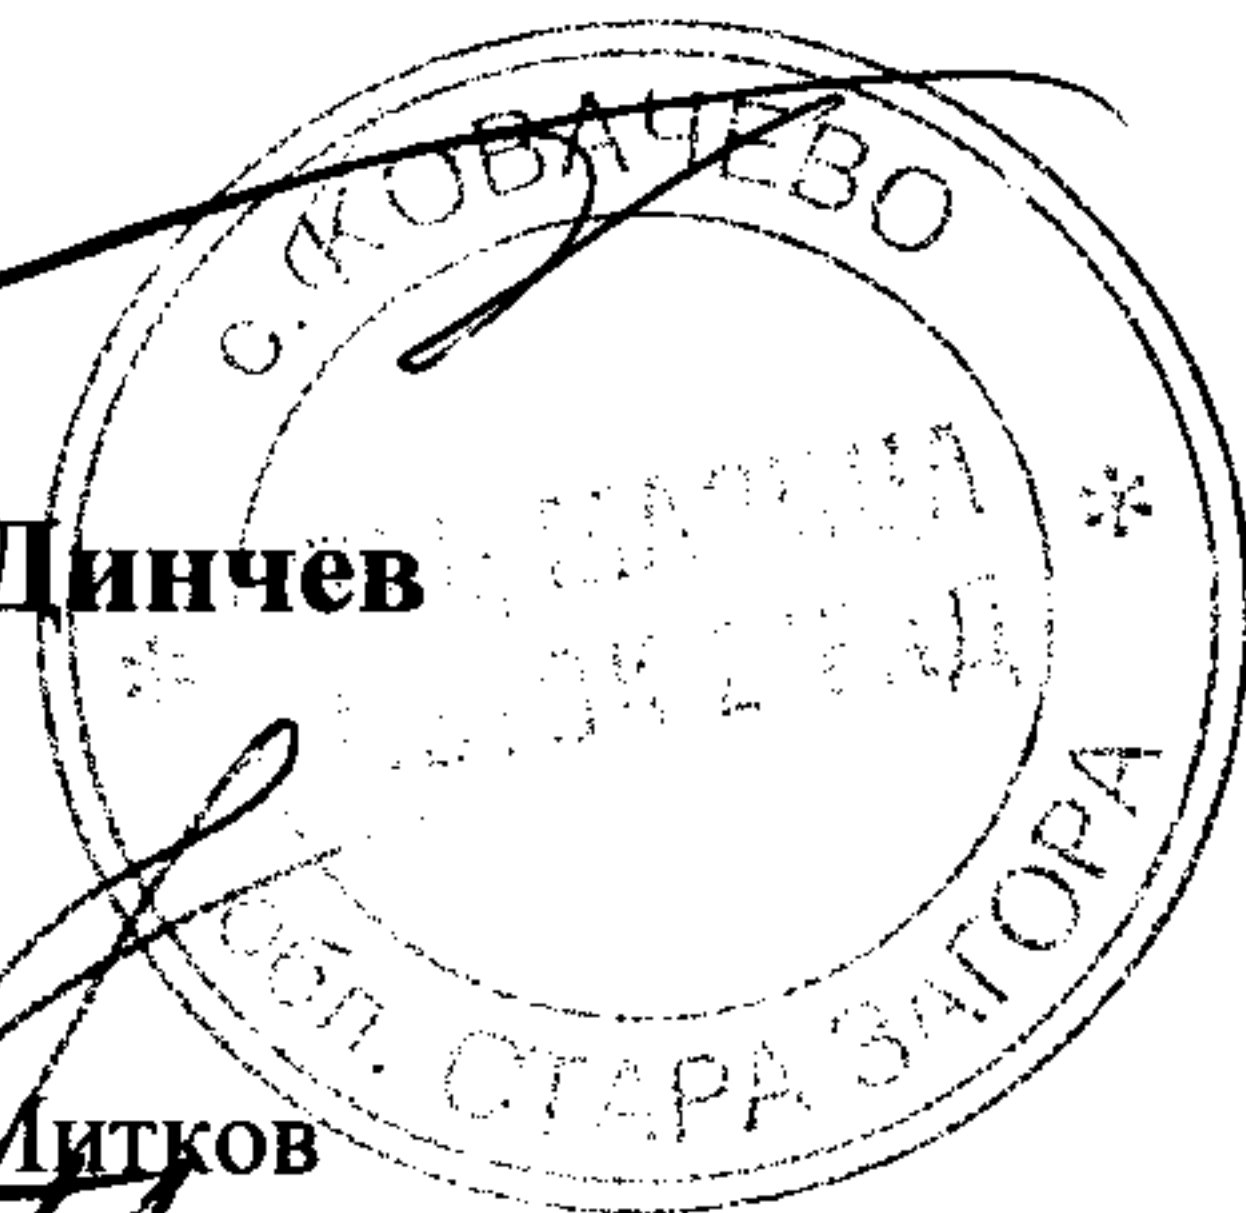

[Handwritten signature]
