

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
КЪМ ДОГОВОР № 13584 от 03.02.2015г

Днес 25.01.2016г в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение №1 към Договор № 13584 от 03.02.2015г год. с предмет: „Разработване на WEB-базирани модули Заявки, Склад и Дърво на съоръженията”, сключен в резултат на проведена обществена поръчка чрез процедура по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП рег. № 914178

“ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, с търг. адрес: 6265 с.Ковачево, община Раднево, обл. Стара Загора, факс: 042/662 507; тел. 042/662 504; регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписвания; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN BG22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBBBG22, “Сосиете Женерал Експресбанк” АД клон Раднево; представлявано от **инж. Живко Динчев – Изпълнителен Директор**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ЕКС СОФТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми км, сграда ЗИТ, корпус 1, вх. 2, ет. 4: тел. 0888 914 800; факс: 02 974 3594; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК: BG175255852; разплащателна сметка IBAN: BG81 PRCB 9230 1015 5795 27, BIC код: PRCBBSF при Банка: “Прокредит банк (България)” АД– град София /офис: Гео Милев; представлявано от **Андрей Андреев – Управител**, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

за следното:

Договор №13584/ 03.02.2015г е свързан с разработка на софтуер в три етапа: Етап 1 „Анализ, проектиране и разработване детайлно техническо задание”, Етап 2 „Разработване на програмния продукт”. Етап 3 „Инсталиране, настройка и тестване на програмния продукт” с обща стойност на договора 39 473.00 лв.


Фирма "ЕКС СОФТ" ЕООД София, като изпълнител по договора е предала в срок Техническото задание. Заданието е прието на Технически съвет след обсъждане и направени допълнения и корекции (Прот. № 26 от 17.04.2015 г) на 17.04.2016 г. С това е приет за приключен Етап 1.

В срок е приключен и Етап 2 „Разработване на програмния продукт”. Фирмата е предала разработеният софтуер на 10.11.2015. Срокът за изпълнение на договора е фиксиран на една календарна година и трябва да приключи на 03.02.2016г.

Предвид фактът, че към края на третото тримесечие „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД отчете съществено намаляване на финансовите резултати, изразяващи се в загуба преди данъци в размер на 68 153 хил.лв. и по предварителни данни към момента на изготвянето на допълнителното споразумение се очаква към края на 2015г загубата преди данъци да е достигнала 112 853 хил.лв. и с оглед на факта че, въвеждането в експлоатация на този софтуер, което представлява Етап 3 по договора не е от изключително спешен порядък се налага срока на договора да се удължи с 4 месеца, като по този начин ще се отложи във времето подлежащия на плащане остатък по договора в размер на 15% от стойността на договора след окончателно приемане на работата по него.

Гореописаното се явява непредвидено обстоятелство по смисъла на чл. 43, ал. 2 от ЗОП, настъпило след подписването на договора, не зависи от волята на страните и не е могло да бъде предвидено, което прави невъзможно изпълнението на договорените условия – а именно изпълнението в срок и в цялост на задължението на изпълнителя по договора, поради което срока за изпълнение следва да се удължи до 03.06.2016 г.

Поради гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а” от ЗОП



СТРАНИТЕ се споразумяха за следното:

1. Срокът на договора, определен в Раздел III, чл.3.1 от същия, се удължава до 03.06.2016 г.
- Срок за изпълнение на етап 3: се изменя на: „8 (месеца) месеца от приключване на етап 2”.


2. Всички други клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си, както и всички Приложения, неразделна част от него.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Изп. директор:
инж. Ж. Динчев



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:
Андрей Андреев

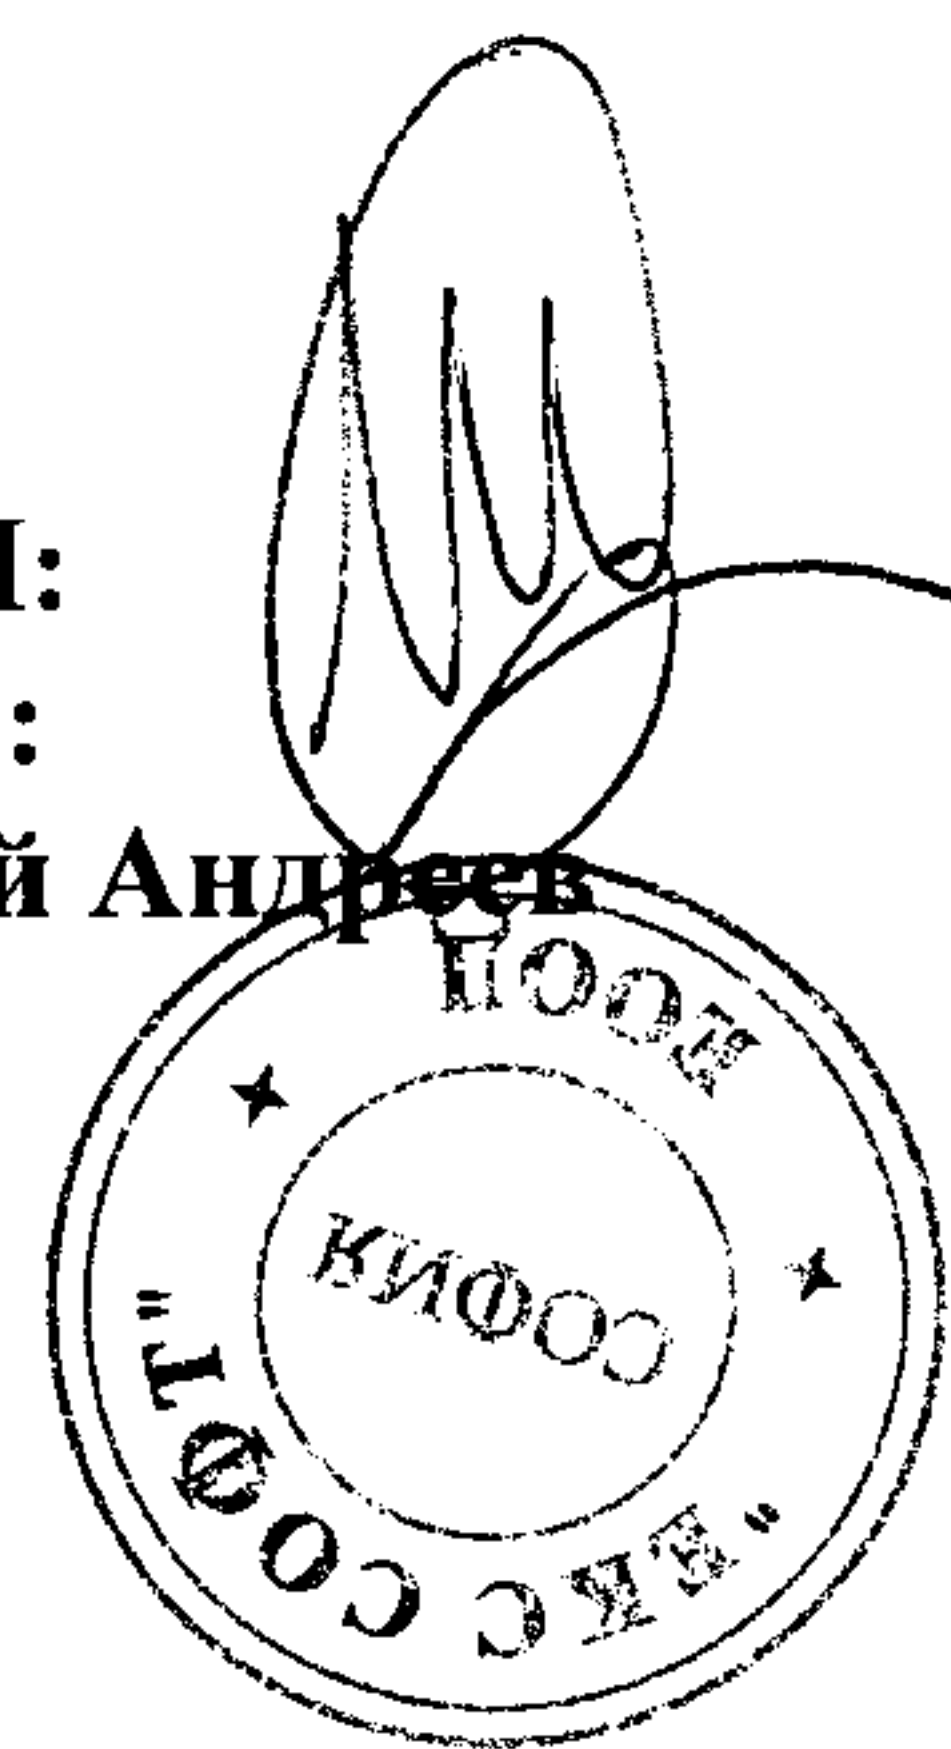

Зам. изп. директор:
инж. М. Мидков

Зам. директор Д "М и ОП":
инж. И. Русев

Директор „Експлоатация”:
инж. И. Стоянов

Директор „АДФК”:
Р. Германов

Директор „ДФИ”:
В. Боев

Гл. счетоводител:
С. Сотиров

Юрисконсулт:
М. Тодоров

Ръководител „ТО”:
М. Макаков

Отг. по договора:
инж. Н. Нейчев
